

# Pejleskema - Vandboring


Vandværk	I/S Skee vandværk	Anlægs-ID	103655
DGU nr:	211.471	Pejling udført af :	HG

Pejlemetode			
Manuelt m. nedstik / Fimap FRWL			
Pejledato	Ro-vandspejl		Bemærkninger
	Tid siden pumpestop i min. (mindst 30 min.)	Pejling - meter under målepunkt	
24-02-2024	60	14,10	HG & LBH
27-05-2024	60	14,25	HG & LBH
21-09-2024	60	14,70	HG & LBH
25-11-2024	60	14,60	HG & LBH
25-02-2025	60	14,38	HG & LBH
04-06-2025	60	14,54	HG & LBH
26-08-2025	60	14,70	HG & LBH
24-11-2025	60	14,63	HG & LBH
25-02-2026	60	14,62	HG & LBH
31-05-2026	60	14,58	HG & LBH

Endelig hyppighed af pejling, aftales med myndigheden/forvaltningen.

Dato : \_\_\_\_\_ Underskrift : \_\_\_\_\_

**Lodret snit gennem brønd / boring :**  
 - målepunktets placering  
 - ca. afstand m/m målepunkt og omgivende terræn

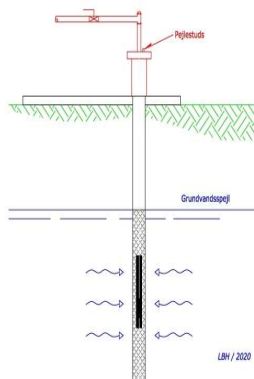

Beskrivelse af målepunkt :	Top boringsforing, nippelkant af pejlingskruen
Målepunktets placering :	Ca. 50 cm over terræn.

