

2026

Pejleskema - Vandboring

Vandværk	I/S Skee vandværk	Anlægs-ID	103655
DGU nr:	211.471	Pejling udført af :	HG & LBH


Pejlemetode	N	Manuelt m. nedstik / Måleudstyr : Fimap FRWL		
Pejledato	M	Ro-/Drift-vandspejl		Bemærkninger
		Tid siden pumpestop i minutter	Pejling - meter under målepunkt	
25-02-2026	1	60	14,62	HG & LBH
31-05-2026	1	60	14,58	HG & LBH
27-08-2026	1	45	14,97	HG & LBH
	1			

Endelig hyppighed af pejling, aftales med myndigheden/forvaltningen.

Dato : _____ Underskrift : _____

Lodret snit gennem brønd / boring :

- målepunktets placering
- ca. afstand mlm målepunkt og omgivende terræn

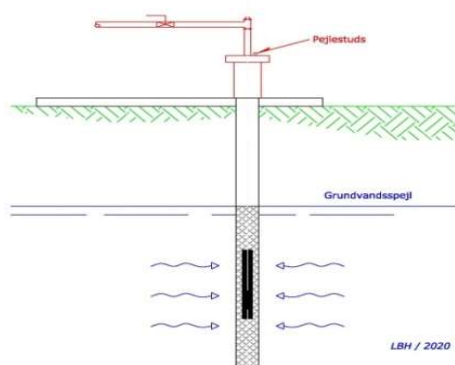

Indmålt dato : 05-12-2020
 Beskrivelse : Top af pejlestuds
 Kote : 64,81m/DVR90
 Kotemetode : DVR90
 Højde : 0,6

Pejlestuds / Målepunkt



Beskrivelse af målepunkt :	Top boringsforing, nippelkant af pejlingsskruen
Målepunktets placering :	Ca. 60 cm over terræn. (Se Rambøll-indmåling på GEUS)
